

Checkliste Teil 1

für Lichtkuppel Sanierung und Reparatur mit Kingspan ESSMANN Produkten

Auftraggeber

Name: _____
 Straße, Nr.: _____
 PLZ / Ort: _____
 Kundennummer: _____

Bauvorhaben


Name: _____
 Straße, Nr.: _____
 PLZ / Ort: _____

Bitte PLZ eintragen! Angabe wird zur Überprüfung der Schneelastzone benötigt.

1. Vorhaben / Maße

☐ Reparatur

(Lichtkuppel erneuern, Sicherheitsrahmen SR bei LK classic erforderlich)

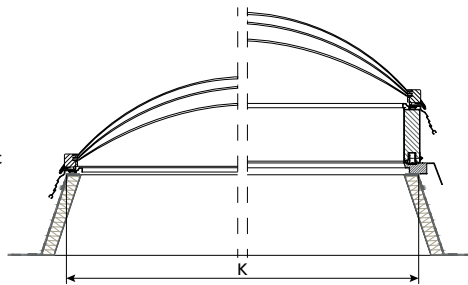

☐ Sanierung

(Lichtkuppel erneuern und durch Sanierungsaufsetzkranz den funktionstüchtigen bauseitigen Aufsetzkranz höher setzen)

Vorhandenes Fabrikat _____


Die Tragfähigkeit der im Dach verbleibenden Unterkonstruktion (z. B. Aufsetzkranz) wurde geprüft. Eine wirksame und dauerhafte Aufnahme der neuen Verschraubungen ist gewährleistet.

☐ Ja

☐ Nein

Angaben für bauseitigen Kranz

K1 _____ cm (Außenmaß)
 K2 _____ cm (Außenmaß)
 a _____ cm (Innenmaß)
 b _____ cm (Innenmaß)
 m _____ cm (Auflagefläche baus. AK)
 h _____ cm (Höhe baus. AK)

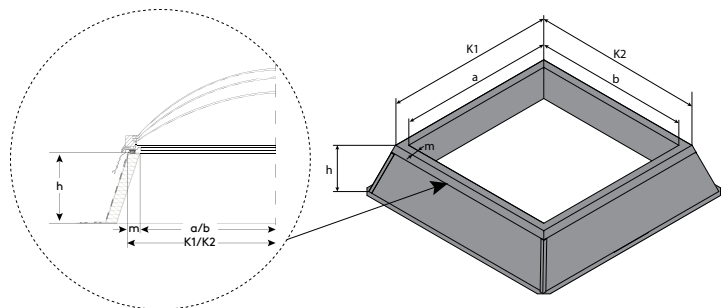

Voraussichtliche Nenngröße

_____ / _____


(Korrektes Aufmaß und ebenes Auflager vorausgesetzt. Im Zweifelsfall bitte Rücksprache mit Kingspan Light + Air Außendienst halten)

Checkliste Teil 2

2. Funktion

- ☐ LK bleibt starr ☐ LK bleibt lüftbar, das vorhandene Aufstellaggregat soll wieder verwendet werden

Art des Aufstellaggregats: _____ (Position und Maße bitte unten eintragen)

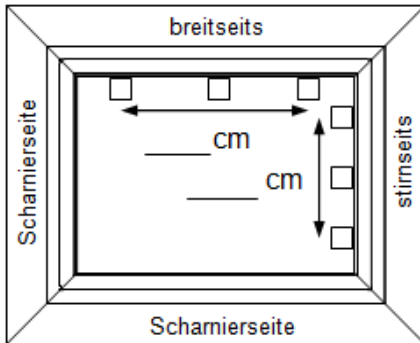

Position Aufstellaggregate

- ☐ breitseits
☐ stirnseits

Ausführung Aufstellaggregate

- ☐ solo
☐ tandem

Abstand zwischen den Aggregaten _____ cm

- ☐ LK wird lüftbar, ein neues Aufstellaggregat wird montiert (Aufstocksystem erforderlich).
☐ Huböffner ☐ Spindel ☐ Elektromotor ☐ pneum. Hubzylinder ☐ Hub: _____ mm

3. Ab- und Durchsturzicherheit

Gemäß ASR A2.1 sind alle konstruktiv nicht durchsturz sicheren Dachöffnungen und -kanten mit geeigneten Umwehrungen, Überdeckungen oder Unterspannungen auszurüsten, die einen Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen bieten.

Informieren Sie sich hier zum Thema "Sicherheit auf dem Dach"

<https://www.kingspan.com/de/de-de/produktgruppen/lichtkuppeln-und-lichtbander/service/dachsicherheit>

Durchsturzicherheit vorhanden ☐

Durchsturzicherheit ☐ mit anbieten ☐ mit liefern

Wir empfehlen Schutzmaßnahmen einzuplanen.

Sicherheitslösungen bei Reparatur

- ☐ Hagel-, Durchsturz- und Sonnenschutz HDS LK ☐ Auffangsicherung LK-K ☐ Ab- und Durchsturz-sicherung EAD LK ☐ Ab- und Durchsturz-sicherung RSM LK

Aufstocksystem erforderlich

Aufstocksystem erforderlich

Bei vorhandener oder nachträglich zu installierender RWA ist Unterstützung durch den Kingspan Light + Air Außendienst erforderlich!

Besondere Hinweise: _____

Sofern verfügbar, bitte Bilder der Innen- und Außenansicht anfügen.

Kingspan Light + Air GmbH

Kingspan-Straße 2
32.107 Bad Salzufen
T: +49 (0) 5222 791-0
E: info@kingspanlightandair.de
www.essmann.de

Version 01 | 09/2026
Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen unverbindlich.

Für die aktuellsten Produktinformationen besuchen Sie bitte unsere Webseite:



QR-Code scannen oder in der PDF-Version anklicken.
